

Réunion d'information travaux

Aménagement du carrefour Fontaine Lestang et de la place du métro

Mercredi 07 octobre 2026

Aimer Vivre à Toulouse

MAIRIE DE TOULOUSE

Quelques rappels pour le bon déroulé de la réunion



Respecter la prise de parole de chacun



Rester courtois envers tous les participants



Prendre la parole de manière brève et concise

⚠

Pour plus d'efficacité, nous vous remercions d'attendre la fin de chaque présentation pour poser vos questions

⚠

Pour toute demande d'ordre privé, veuillez prendre rendez-vous :

Par téléphone : 05 81 91 77 38

Par mail : florian.delrieu@mairie-toulouse.fr

ORDRE DU JOUR

Introduction du Maire de quartier : Florian DELRIEU

1. Rappel du projet et éléments de contexte
2. Présentation du phasage des travaux
3. Temps de questions/réponses

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE

1

Rappel du projet et éléments de contexte

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE

HISTORIQUE DU PROJET

2020
Sécurisation et végétalisation du carrefour demandée par les habitants

2021/2022
2 projets successifs étudiés et réfutés par les associations de quartier

2023
Projet proposé et retenu dans le cadre du budget participatif « Mes idées pour mon quartier »

09 septembre 2025
Consultation et présentation du projet aux associations du quartier

19 octobre 2026
Démarrage des travaux de voirie et de végétalisation


Printemps 2027
Livraison de la nouvelle place

Temps d'étude

LE PROJET D'AMENAGEMENT

- **Sécurisation du carrefour** grâce à une nouvelle configuration réduisant les vitesses de circulation et intégrant des traversées piétonnes sécurisées.

- **Amélioration du confort thermique** par la réduction des îlots de chaleur urbains, grâce à la désimperméabilisation des sols, à la plantation d'arbres et de végétaux.

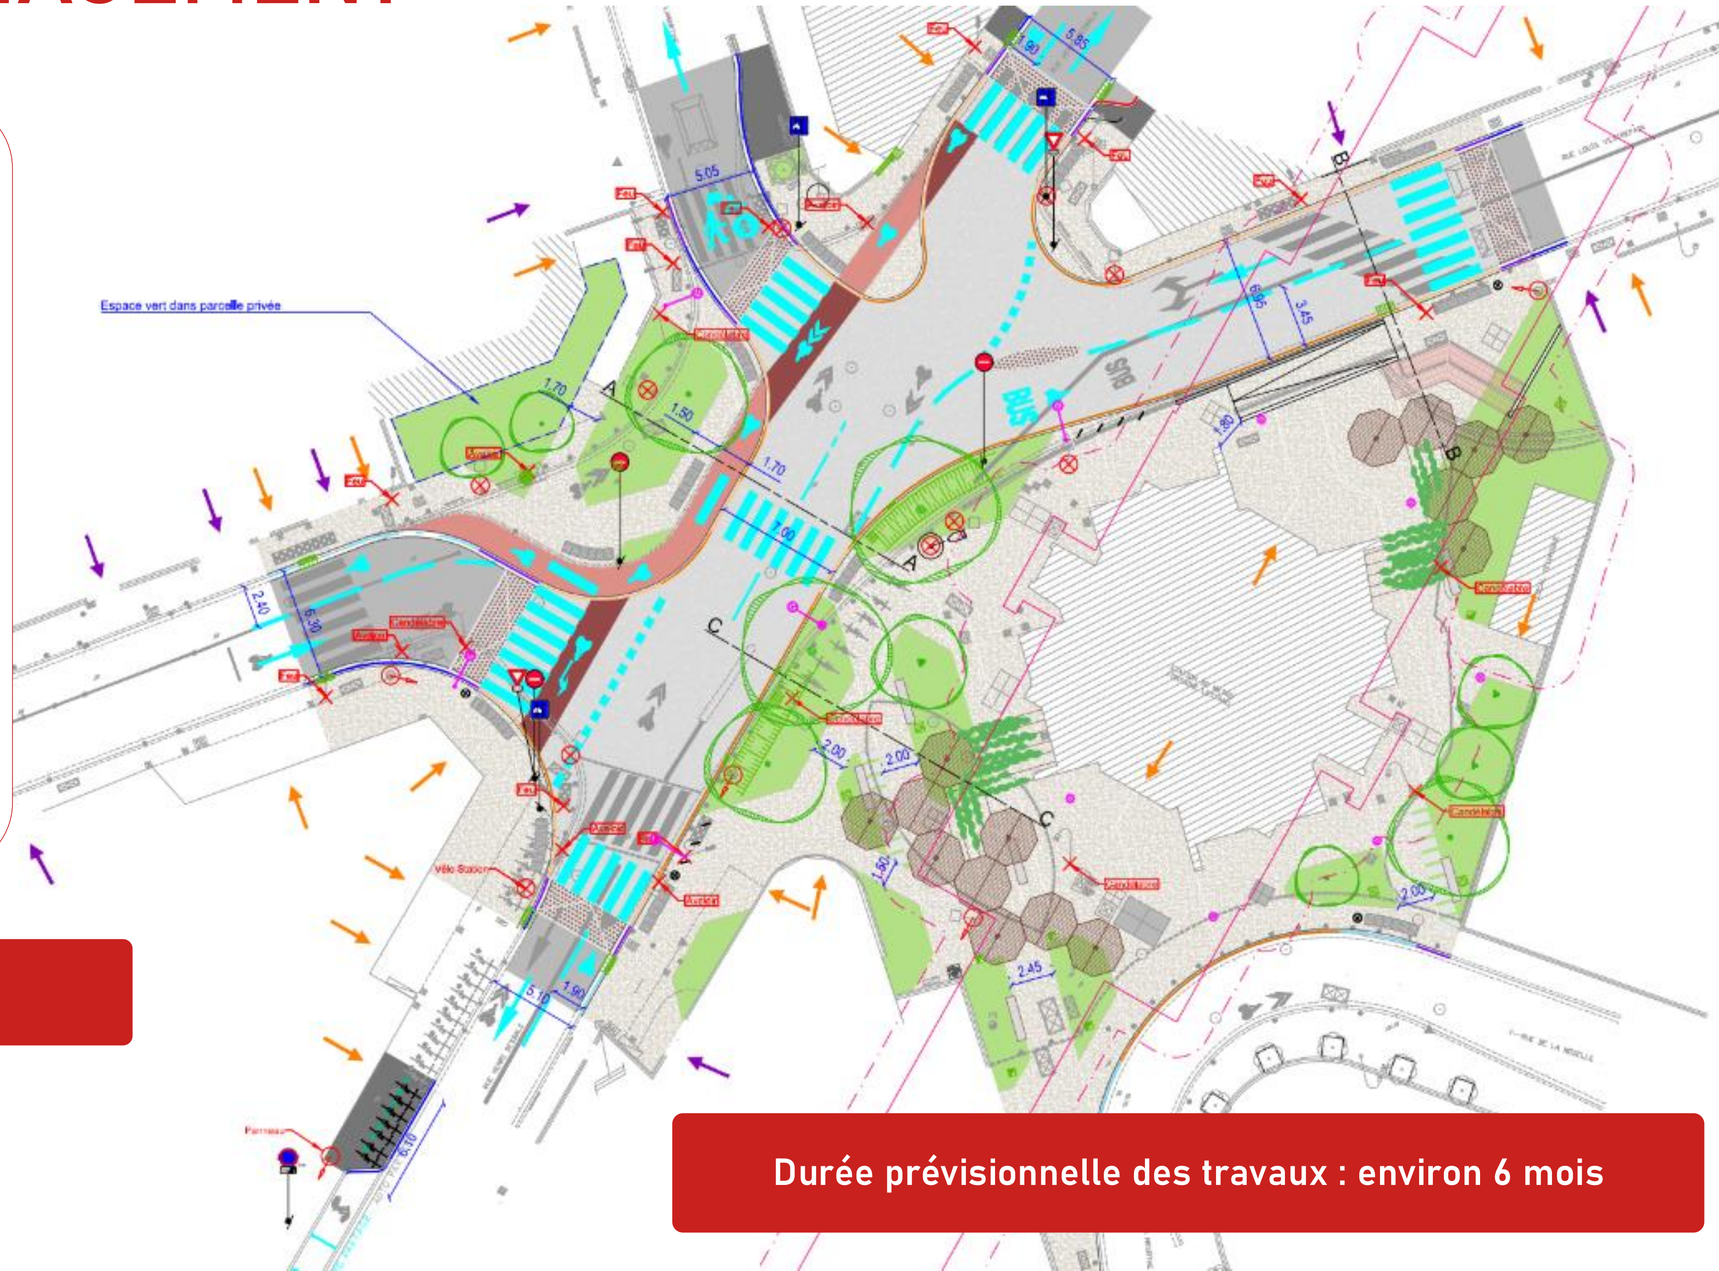


Coût de l'opération : 850 000 € TTC

Durée prévisionnelle des travaux : environ 6 mois

LE PROJET D'AMENAGEMENT



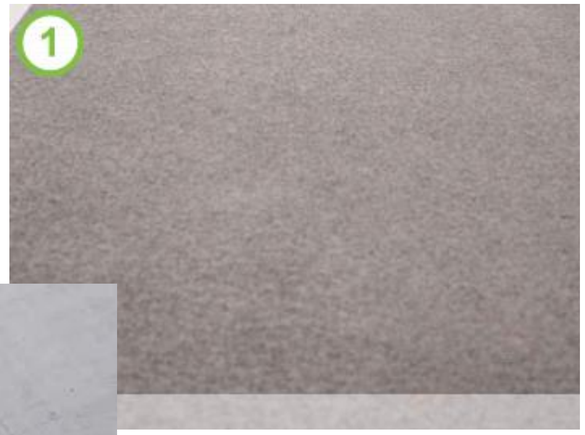



Béton taloché





Calepinage en béton poncé




Enrobé rouge

LE PROJET D'AMENAGEMENT

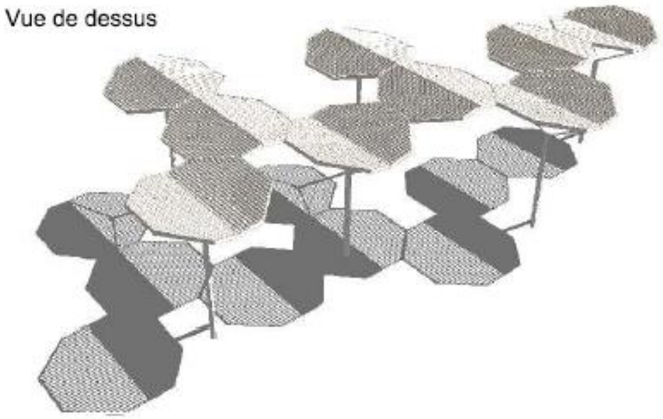

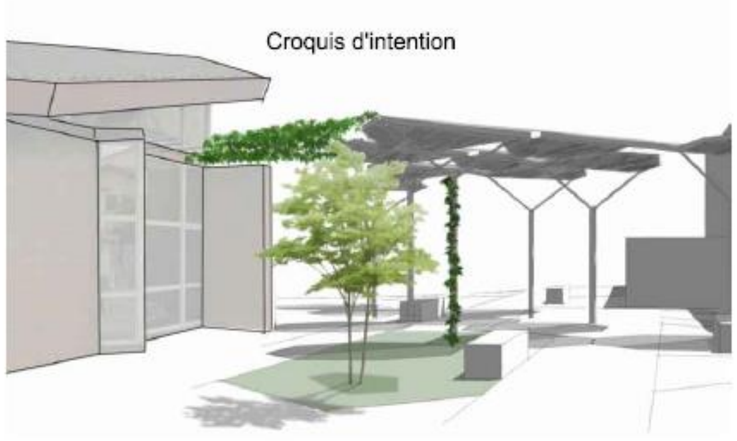


des treilles végétalisées

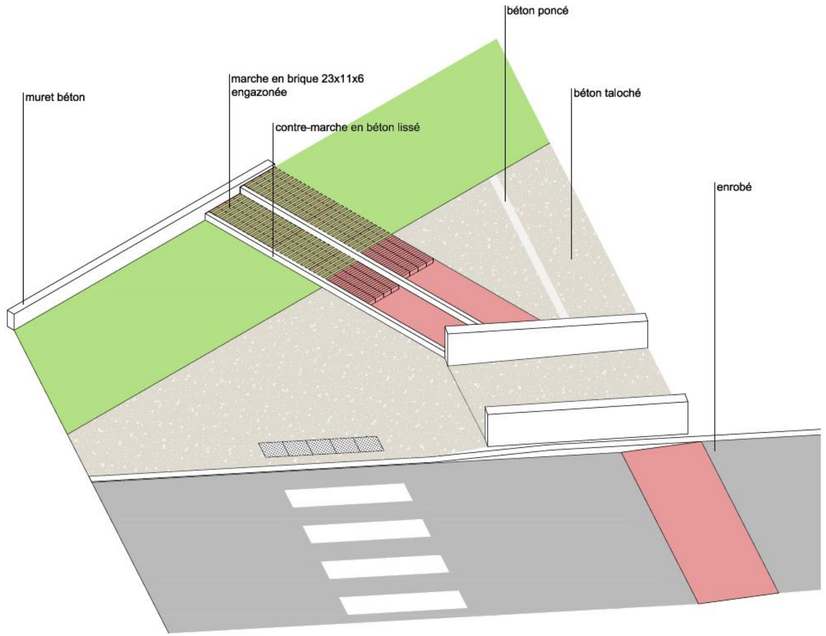


Emmarchement enherbé

LE PROJET D'AMENAGEMENT





Koelreuteria paniculata
Savonnier




Zelkova serrata
Orme de Sibérie



Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Poirier d'ornement




Cercis siliquastrum
Arbre de Judée



Acer tataricum subsp. ginnala
Erable de Chine











Passiflora caerulea
Passiflore bleue
Type de feuillage: Persistant
Floraison : Blanc/Bleu, Juin-Septembre
Hauteur à maturité : 6.00m

Trachelospermum jasminoides
Jasmin étoilé
Type de feuillage: Persistant
Floraison : Blanc, Mai-Juillet
Hauteur à maturité : 6.00m











Fallopia aubertii
Renouée d'Aubert
Type de feuillage: Caduc
Floraison : Blanc, Juin-Septembre
Hauteur à maturité : 6.00 m et plus

Lonicera x heckrottii 'Goldflame'
Chèvrefeuille 'Goldflame'
Type de feuillage: Caduc
Floraison : Rouge/Orange, Juin-Septembre
Hauteur à maturité : 4.00m

2

Présentation du phasage des travaux

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE

Les "impératifs" pendant les travaux



Maintien des **continuités piétonnes et cyclables**




Maintien des **accès aux commerces et associations**



Fluidité d'accès à la station de métro et maintien des **accès secours**



Respect des **contraintes travaux à proximité du métro**



Limiter **l'impact circulatoire** sur le carrefour Fontaine Lestang / Minimisation des travaux sous route barrée



Respect des **périodes de plantation**



Organisation de **réunions de chantier** régulières tout au long des travaux


PHASE 1 : TROTTOIR SUD - VESTREPAIN/DESBALS

Octobre 26	Novembre 26	Décembre 26	Janvier 26	Février 26	Mars 26	Avril 26	Mai 26

Du 19/10 à début Novembre

GESTION DE LA ZONE CHANTIER

- Circulation maintenue
- Utilisation du double sens cyclable pour la circulation VL
- Circulation cyclable mutualisée avec les VL au droit de la zone travaux
- Balisage de la zone travaux avec des barrières "ville de Toulouse" et des GBA
- Maintien du cheminement piéton (tapis rouge au sol)

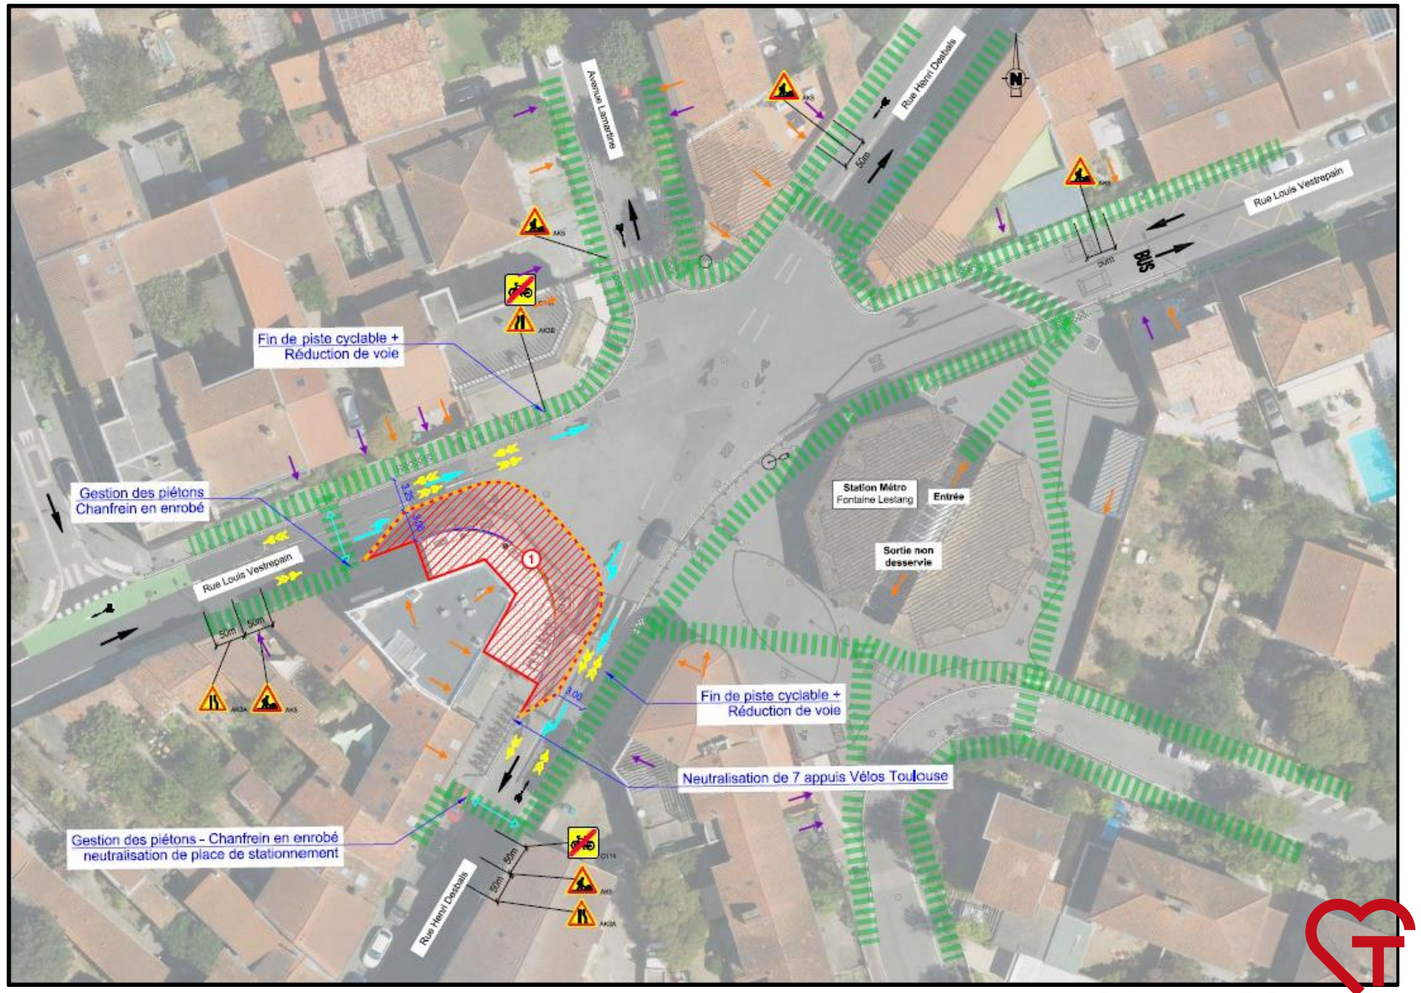

Réunion d'information travaux – Fontaine Lestang
Mercredi 07 octobre 2026

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE


PHASE 2 : TROTTOIR NORD - VESTREPAIN/DESBALS

Octobre 26	Novembre 26	Décembre 26	Janvier 26	Février 26	Mars 26	Avril 26	Mai 26

De Début Novembre à mi Novembre

GESTION DE LA ZONE CHANTIER

- Circulation maintenue avec alternat manuel pour la gestion des bus TISSEO
- Utilisation du double sens cyclable pour la circulation VL
- Circulation cyclable mutualisée avec les VL au droit de la zone travaux
- Balisage de la zone travaux avec des barrières "ville de Toulouse" et des GBA
- Maintien du cheminement piéton (tapis rouge au sol)

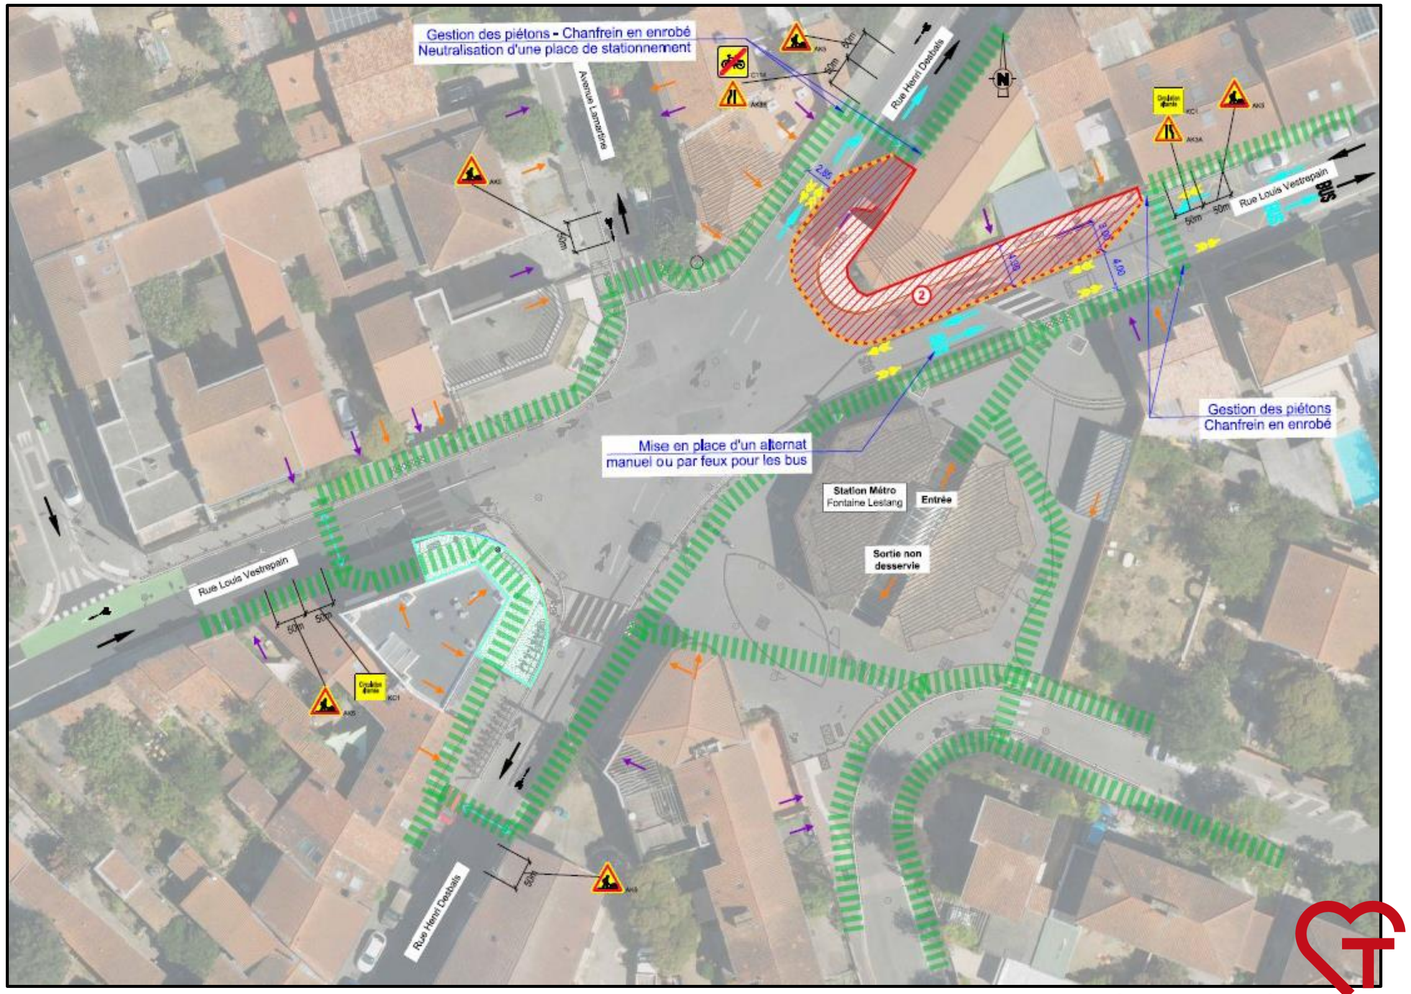

Réunion d'information travaux – Fontaine Lestang
Mercredi 07 octobre 2026

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE


PHASE 3 : TROTTOIR VESTREPAIN/LAMARTINE ET LAMARTINE/DESBLALS

Octobre 26	Novembre 26	Décembre 26	Janvier 26	Février 26	Mars 26	Avril 26	Mai 26

De mi Novembre à mi Janvier

GESTION DE LA ZONE CHANTIER

- rue Larmatine en route barrée et mise en double sens pour l'accès des riverains.
- Cheminement piéton dédié depuis la rue Lamartine suivant la zone travaux
- Utilisation du double sens cyclable pour la circulation VL
- Circulation cyclable mutualisée avec les VL au droit de la zone travaux
- Balisage de la zone travaux avec des barrières "ville de Toulouse" et des GBA
- Maintien du cheminement piéton (tapis rouge au sol)

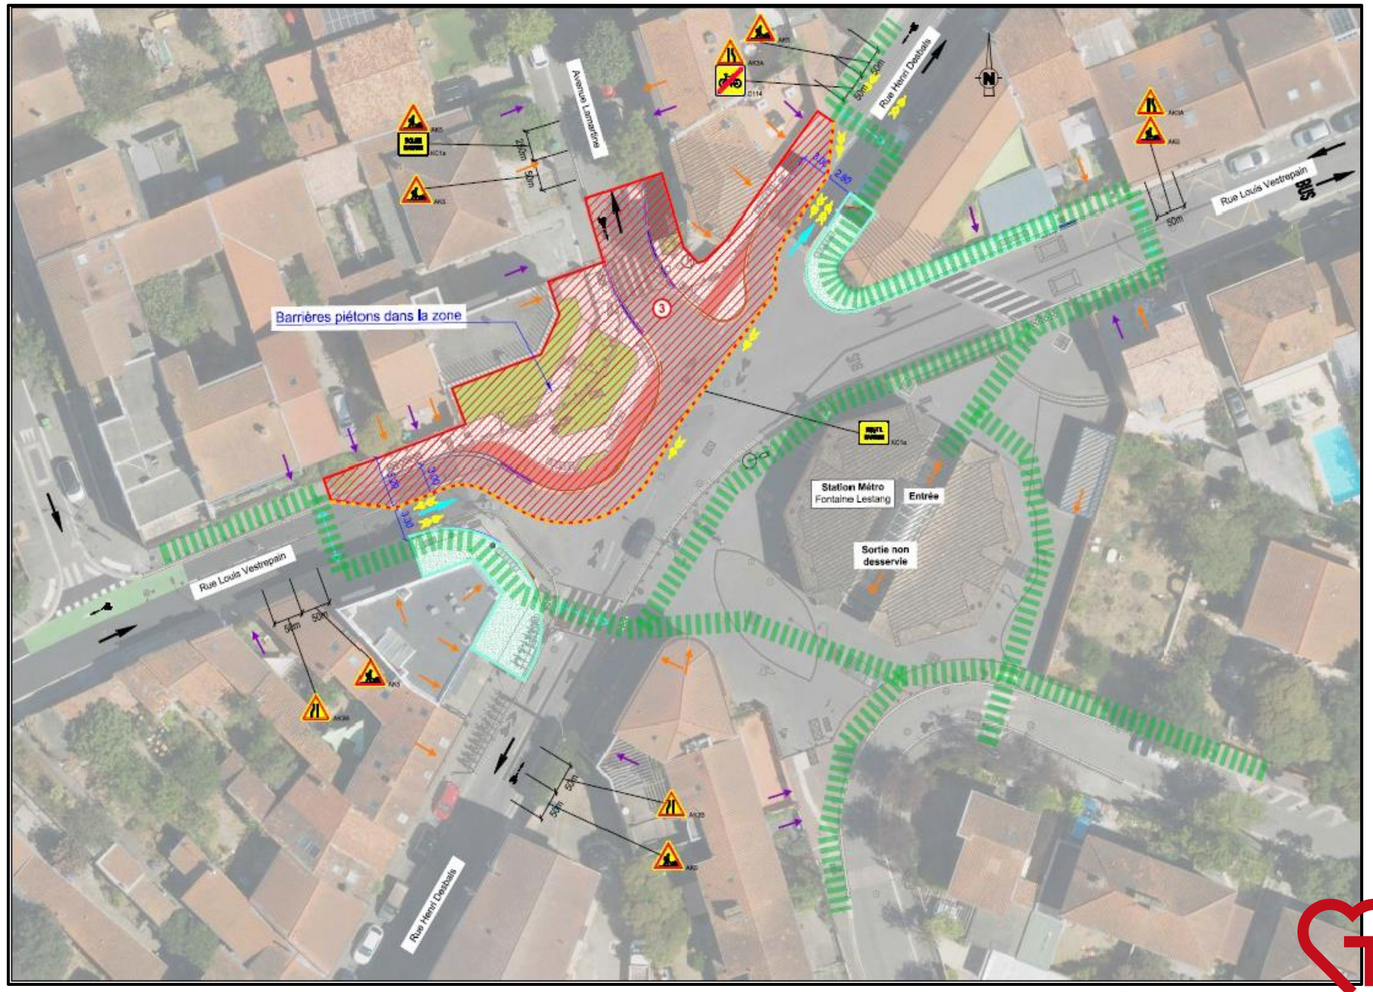

Réunion d'information travaux – Fontaine Lestang
Mercredi 07 octobre 2026

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE

PHASE 3 : PLAN DE DEVIATION RIVERAINS

Mise à double sens de l'avenue Lamartine pour accès riverains




PHASE 4 : BORDURES CÔTE METRO

Octobre 26	Novembre 26	Décembre 26	Janvier 26	Février 26	Mars 26	Avril 26	Mai 26

De mi Janvier à début Février

GESTION DE LA ZONE CHANTIER

- Mise en place d'une rampe PMR provisoire.
- Utilisation du double sens cyclable pour la circulation VL
- Circulation cyclable mutualisée avec les VL au droit de la zone travaux
- Balisage de la zone travaux avec des barrières "ville de Toulouse" et des GBA
- Maintien du cheminement piéton (tapis rouge au sol)

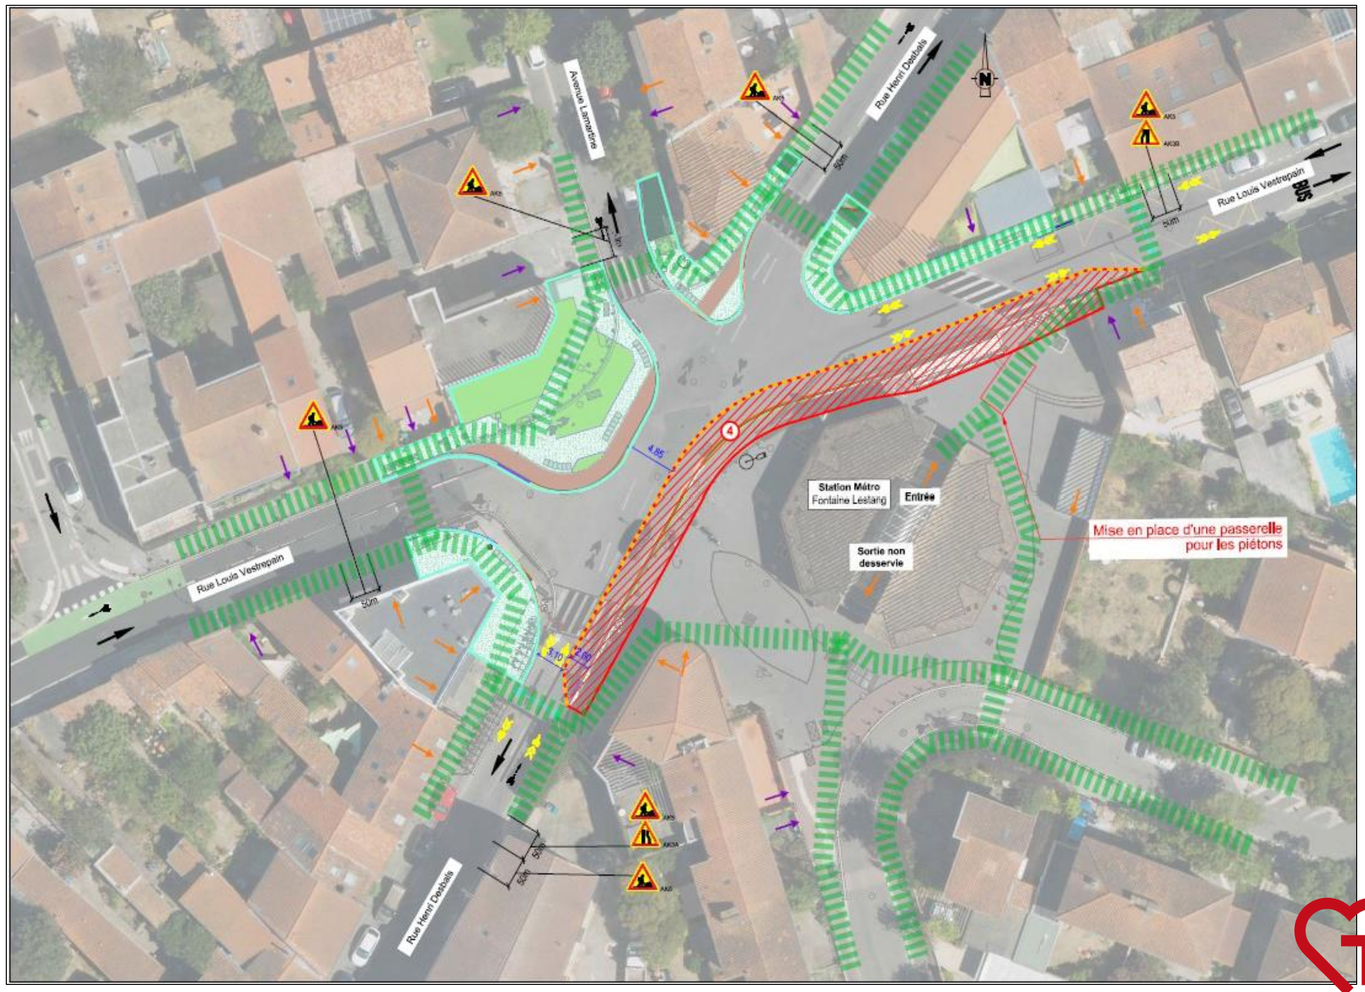

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE


PHASE 5 : REALISATION DU PLATEAU RALENTISSEUR CENTRAL

Octobre 26	Novembre 26	Décembre 26	Janvier 26	Février 26	Mars 26	Avril 26	Mai 26

De début février à mi février

GESTION DE LA ZONE CHANTIER

- **Fermeture du carrefour à la circulation**.
- Cyclistes mutualisés avec les piétons durant cette phase. Passage sur trottoirs.
- Balisage de la zone travaux avec des barrières "ville de Toulouse" et des GBA
- Maintien du cheminement piéton (tapis rouge au sol)

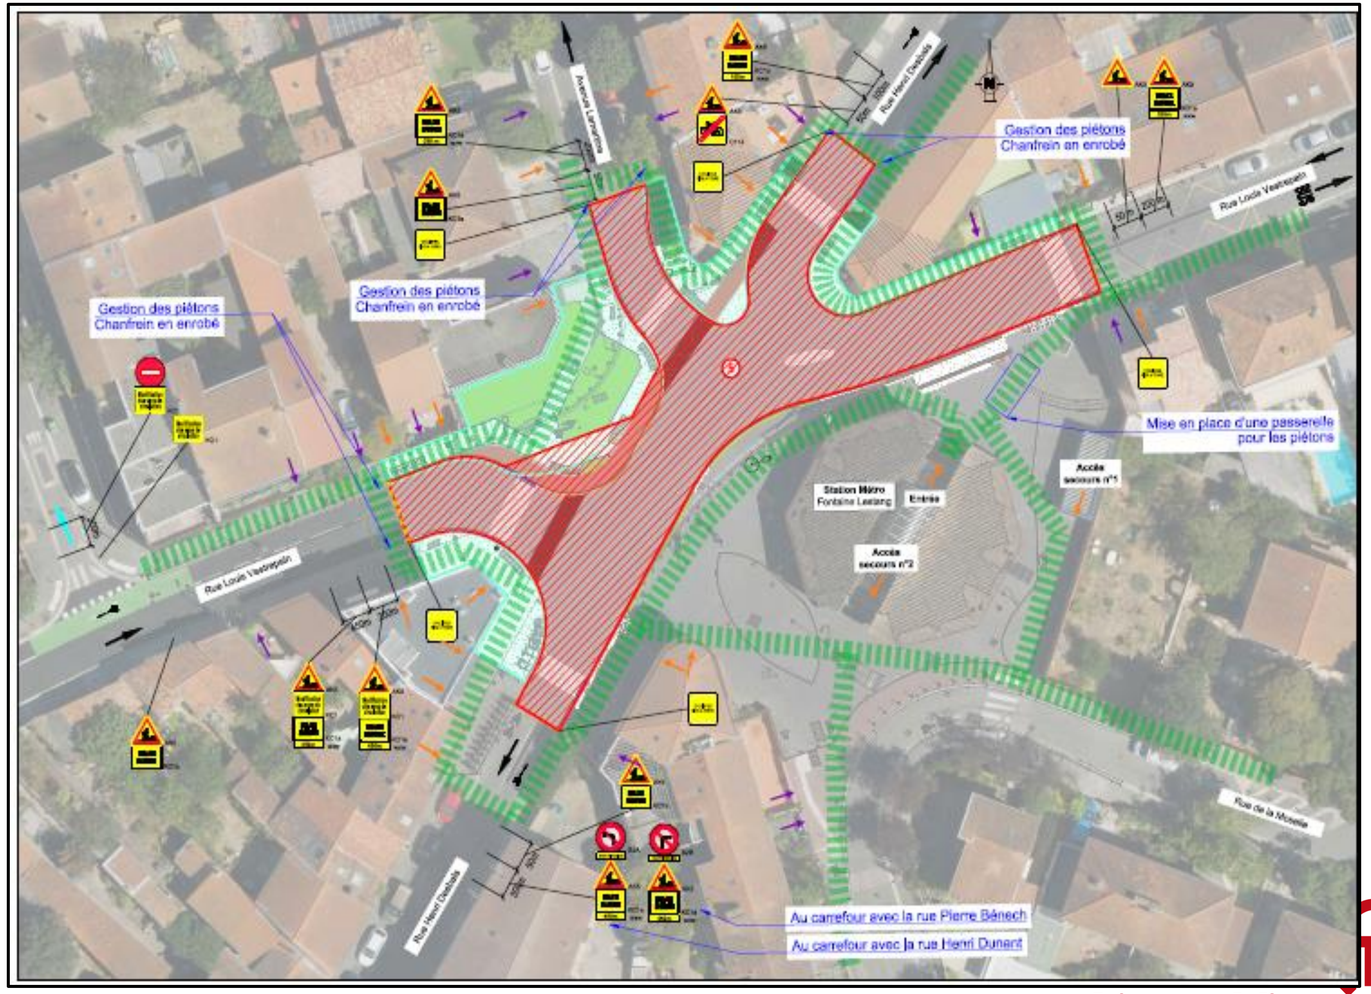


Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE

PHASE 5 : PLAN DE DEVIATION

DEVIATIONS :

1. Itinéraire 1 : depuis Vestrepain (ouest) vers Gerbault / Lamartine / Desbals (Nord)
2. Itinéraire 2 : depuis route de St Simon vers Vestrepain (Ouest)
3. Itinéraire 3 : depuis Vestrepain (Est) vers Desbals (Sud)
4. Déviation L13

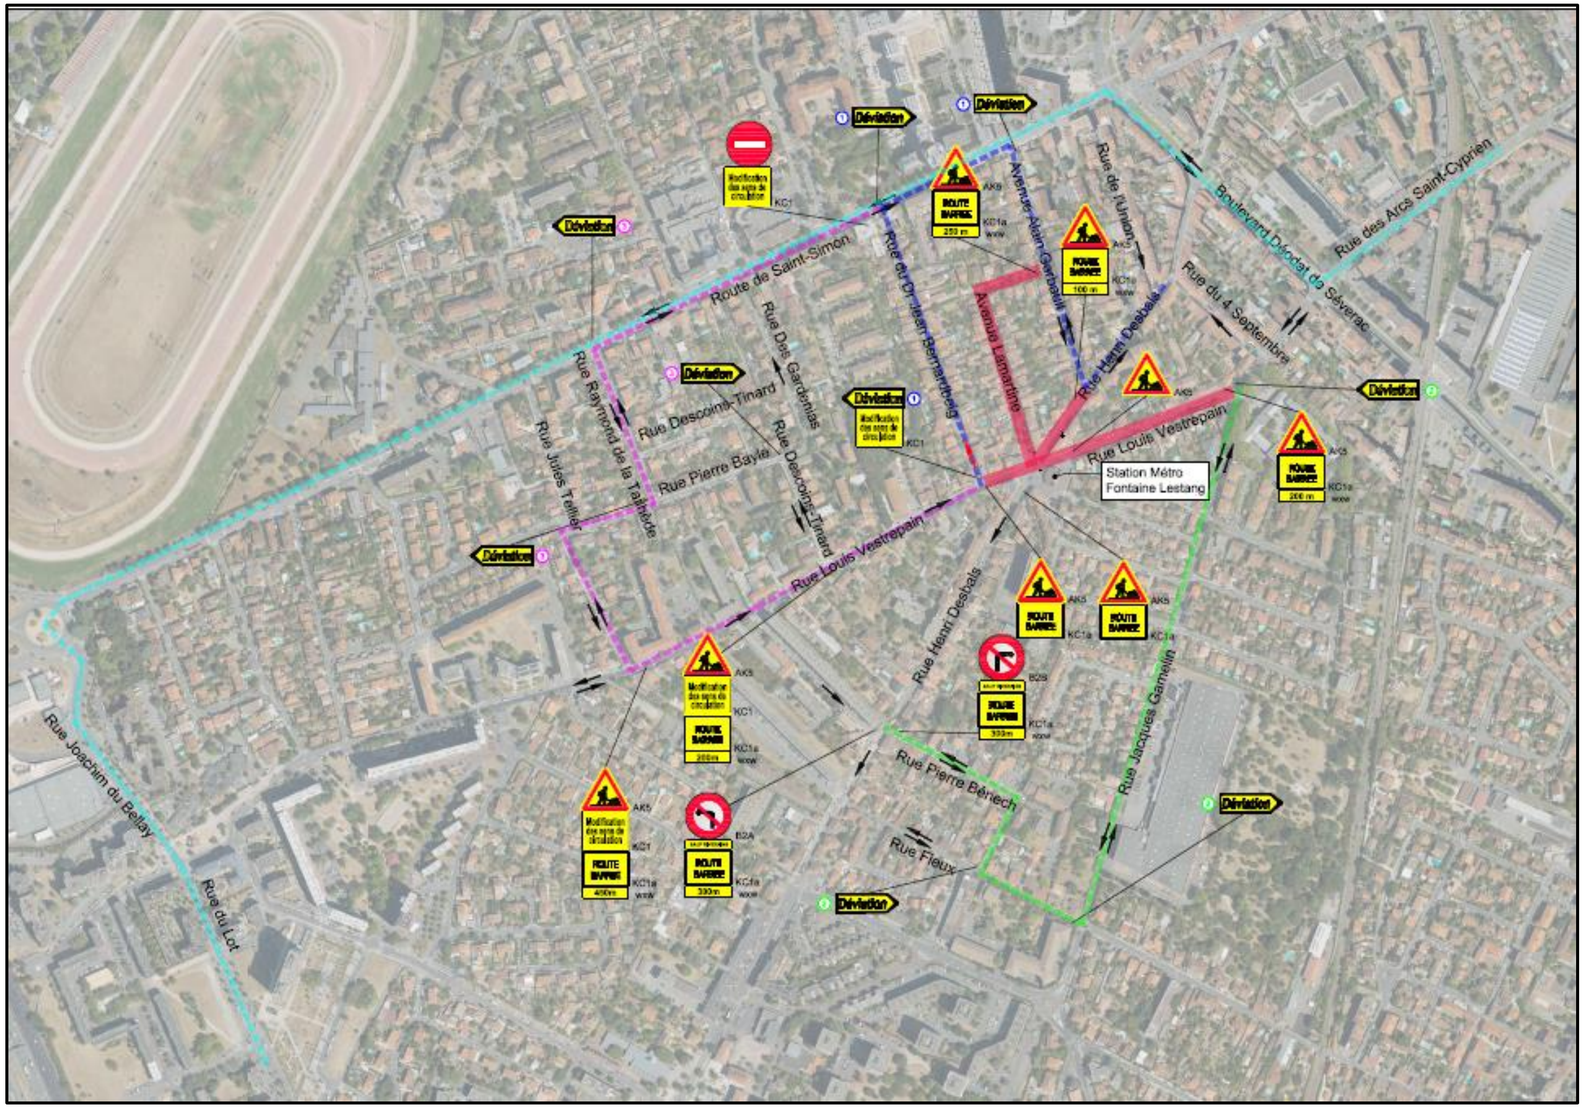


PHASE 6 : TROTTOIR SUD METRO

Octobre 26	Novembre 26	Décembre 26	Janvier 26	Février 26	Mars 26	Avril 26	Mai 26

De mi-Février à mi-Mars

GESTION DE LA ZONE CHANTIER

- Travaux en quart de place pour maintenir les circulations pétionnes depuis et vers le métro
- Maintien des accès au métro
- Balisage de la zone travaux avec des barrières "ville de Toulouse et des GBA
- Maintien du cheminement piéton (tapis rouge au sol)

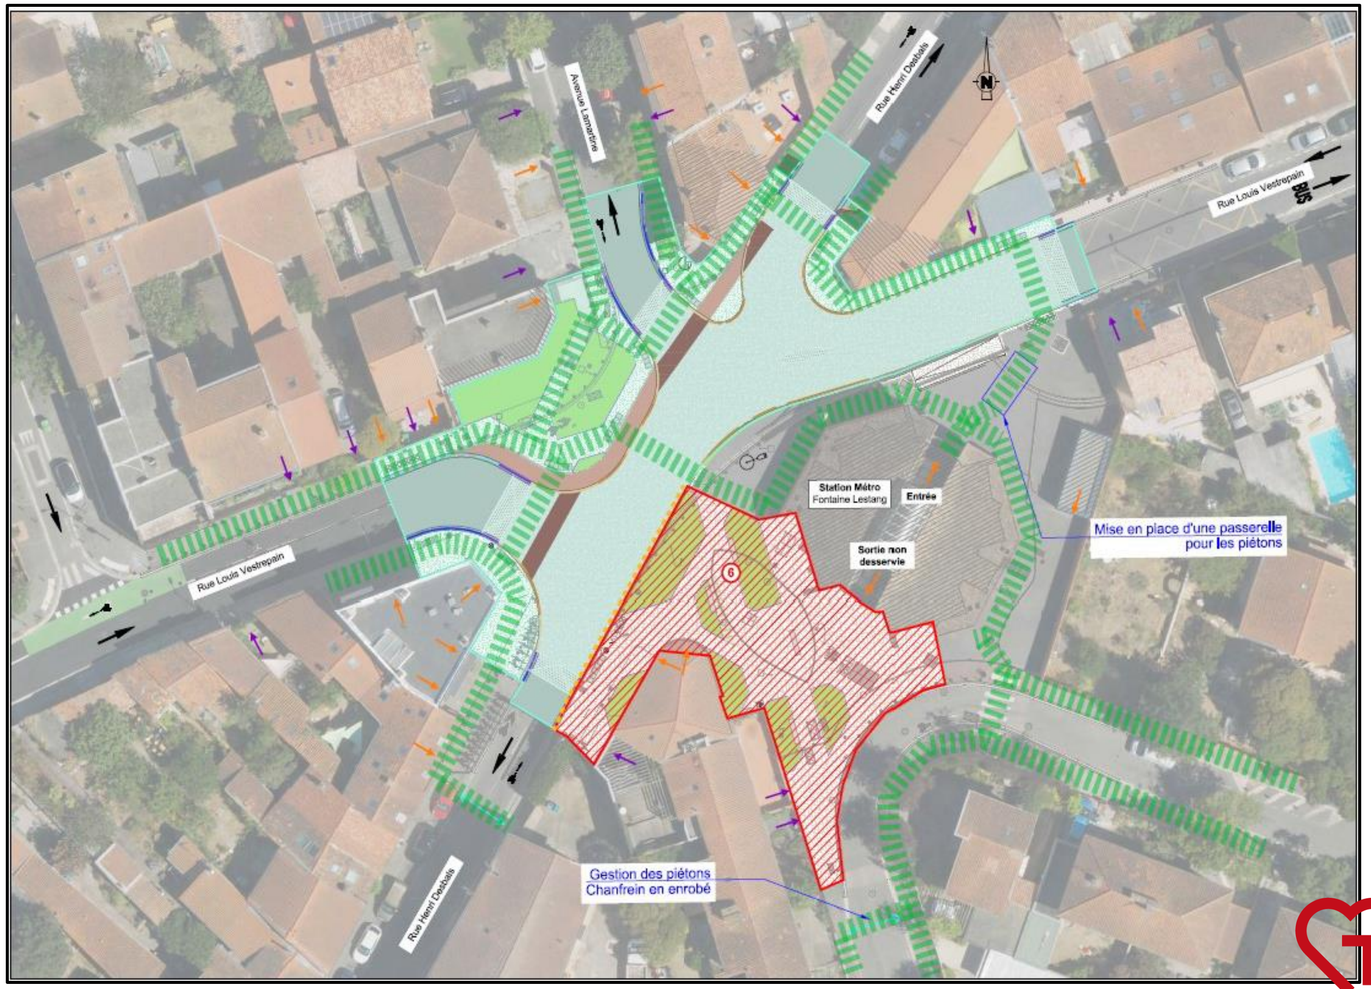

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE


PHASE 7 : TROTTOIR NORD-OUEST METRO

Octobre 26	Novembre 26	Décembre 26	Janvier 26	Février 26	Mars 26	Avril 26	Mai 26

De début-mars à fin-Mars
Chevauchement possible avec la phase 6

GESTION DE LA ZONE CHANTIER

- Travaux en quart de place pour maintenir les circulations pétionnes depuis et vers le métro
- Restitution de la rampe PMR définitive
- Maintien des accès au métro
- Balisage de la zone travaux avec des barrières "ville de Toulouse et des GBA
- Maintien du cheminement piéton (tapis rouge au sol)

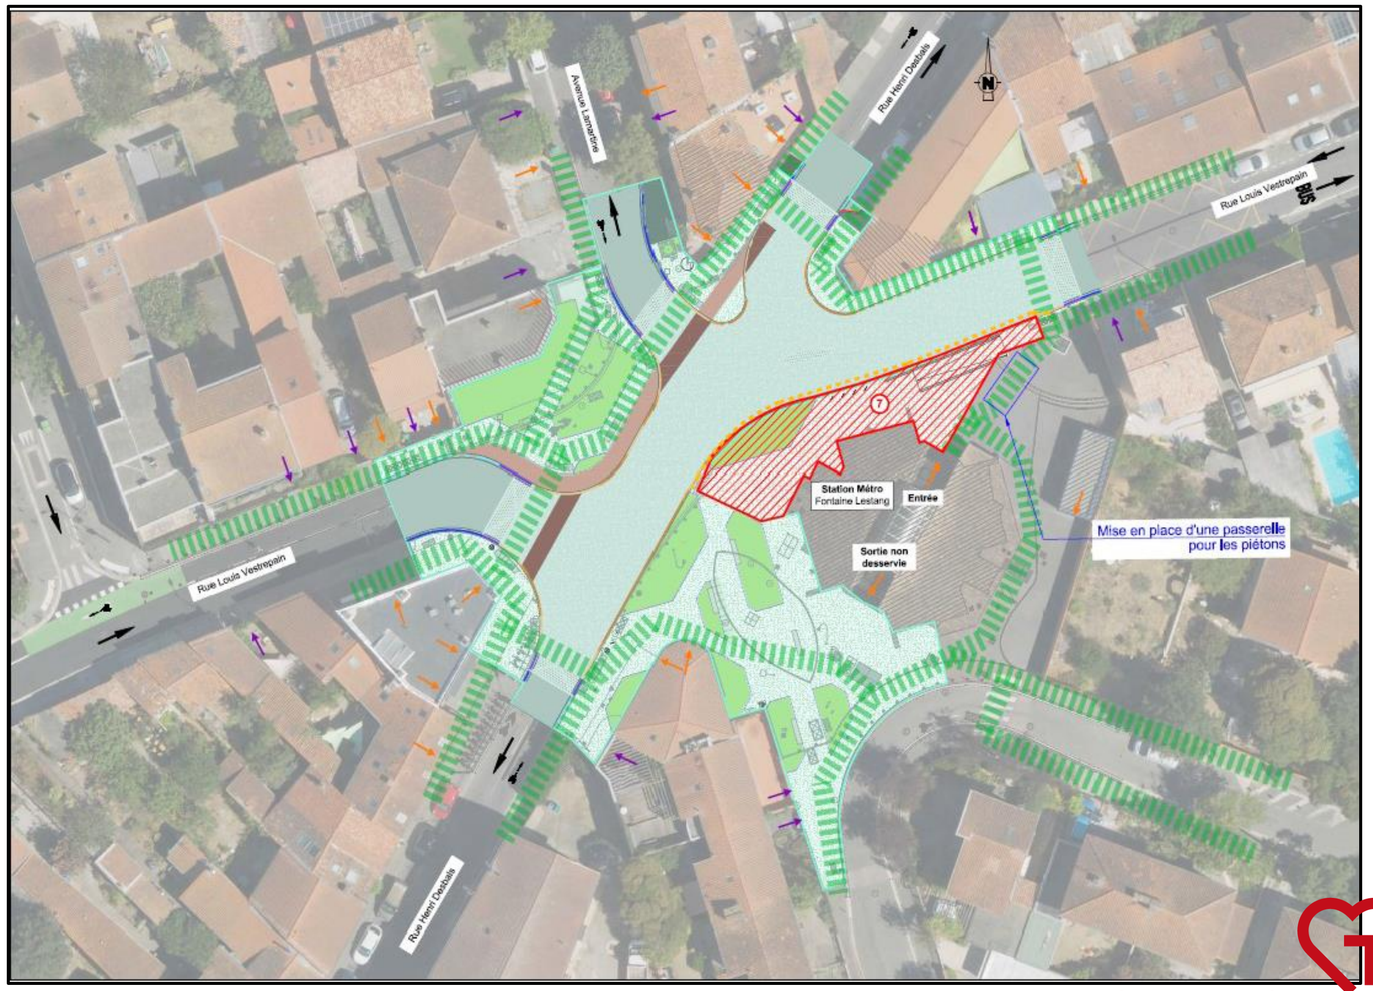

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE


PHASE 8 : TROTTOIR NORD-EST METRO

Octobre 26	Novembre 26	Décembre 26	Janvier 26	Février 26	Mars 26	Avril 26	Mai 26

De fin-mars à fin-Avril


GESTION DE LA ZONE CHANTIER

- Travaux en quart de place pour maintenir les circulations pétionnes depuis et vers le métro
- Maintien des accès au métro
- Balisage de la zone travaux avec des barrières "ville de Toulouse" et des GBA
- Maintien du cheminement piéton (tapis rouge au sol)

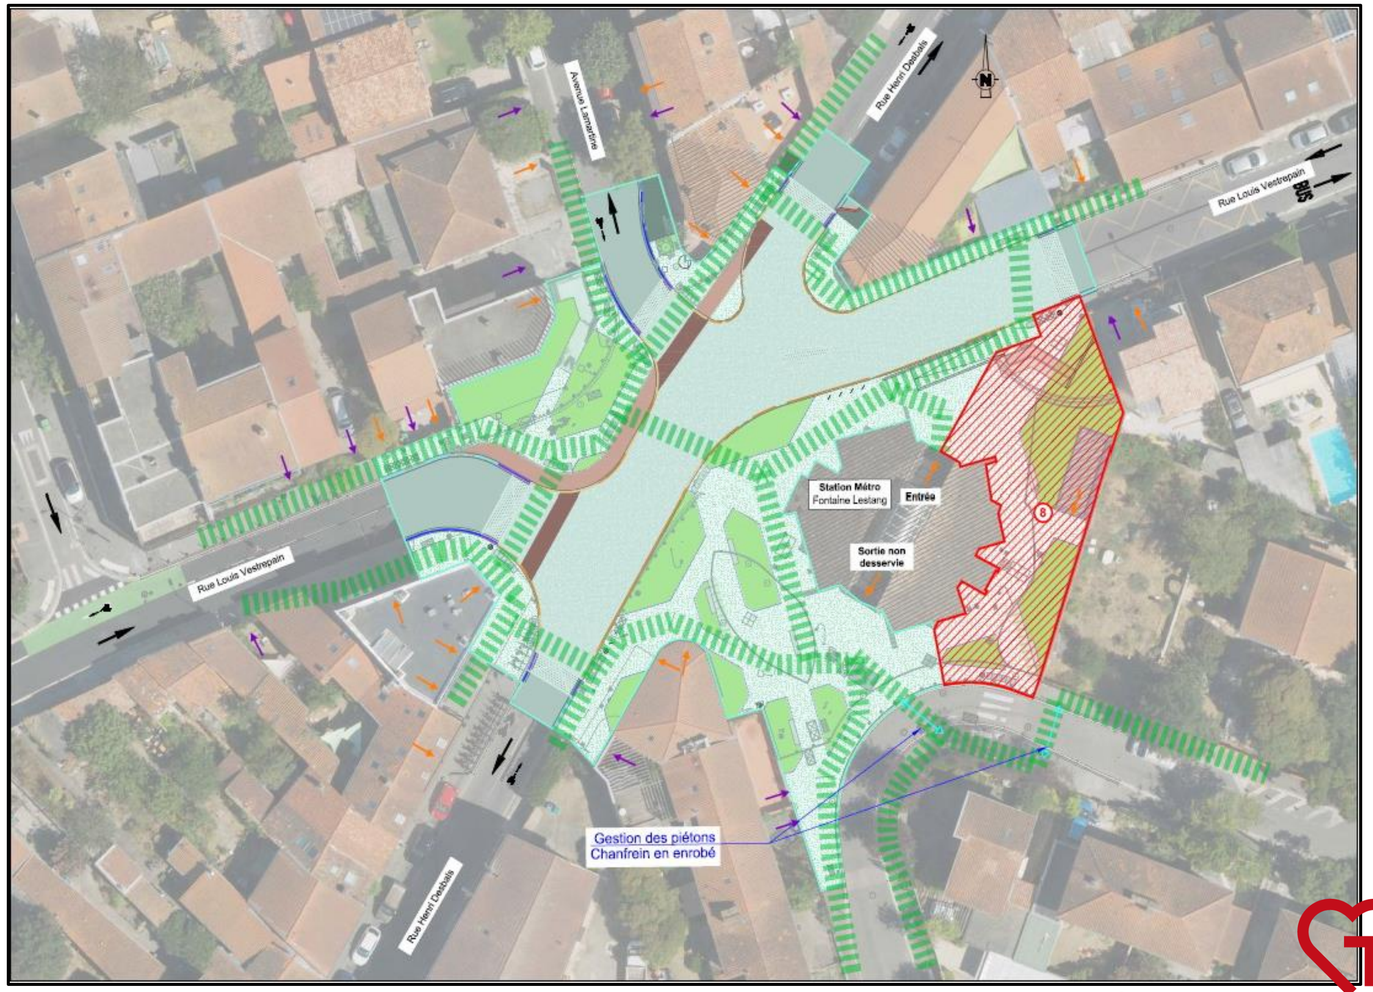

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE

ZONES D'INSTALLATION ET DE STOCKAGE DURANT LES TRAVAUX

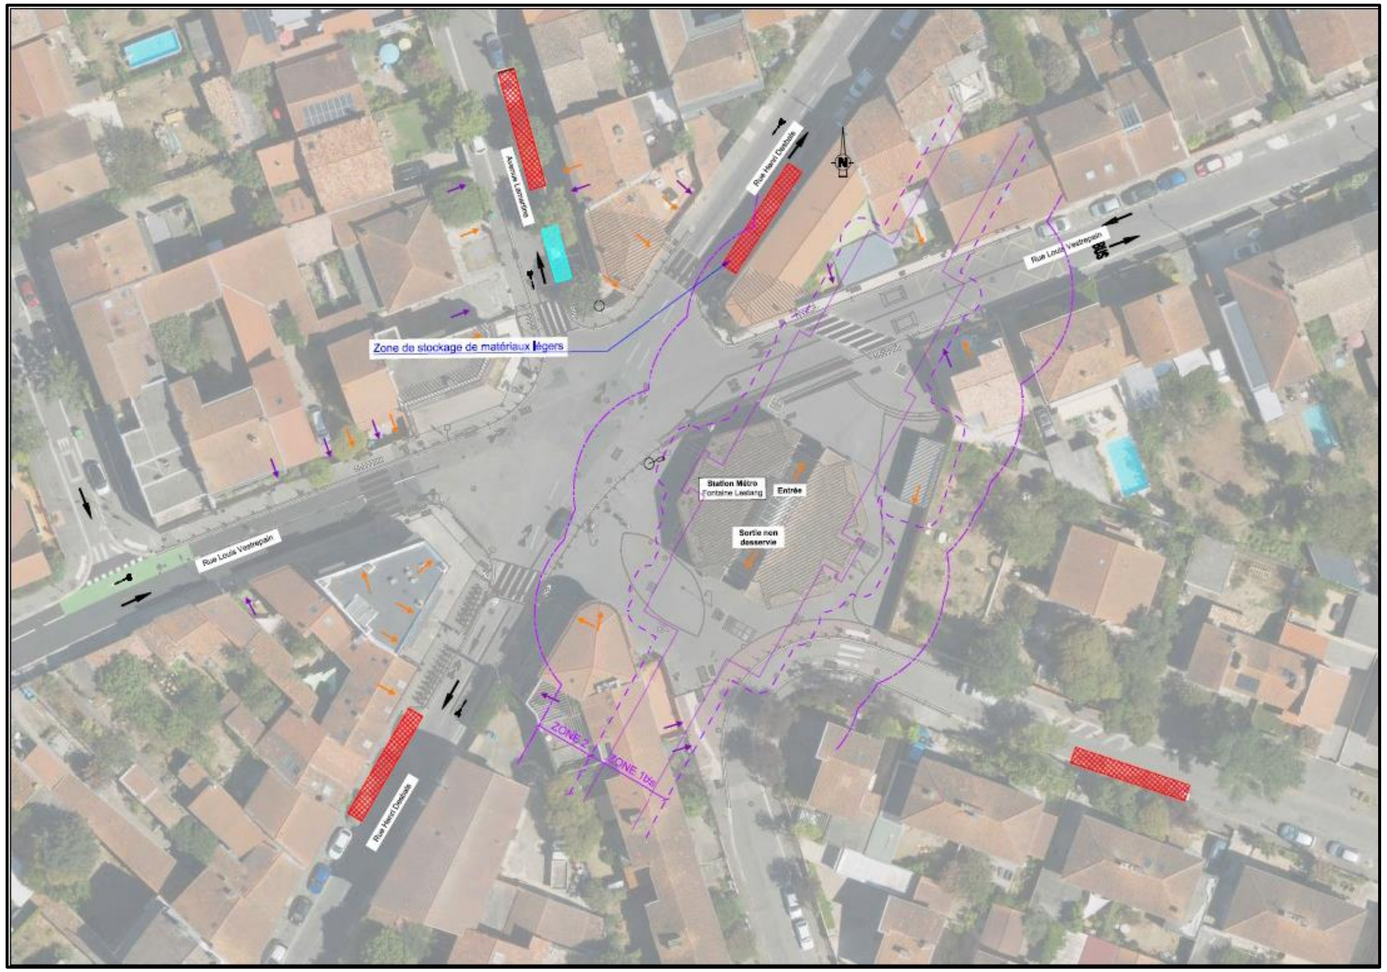

- Sens de circulation existant
- Zonage Tisséo
- Zone de stockage sur stationnement
- VRS

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Inscrivez-vous à la newsletter du quartier

DELRIEU Florian – Votre Maire de quartier !
Téléphone : 05 81 91 77 38
Mail : florian.delrieu@mairie-toulouse.fr

Aimer Vivre à Toulouse
MAIRIE DE TOULOUSE
